


施工进度计划

唯品会华东运营总部项目一期工程一标段施工总承包工程（安装部分）

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	第二季度		第三季度		第四季度		第一季度		第二季度	
					2017年03月	2017年05月	2017年07月	2017年09月	2017年11月	2018年01月	2018年03月	2018年05月		
1	总工期	276 工作日	2017年10月26日	2018年07月28日										
2	前期准备	6 工作日	2017年10月26日	2017年10月31日										
3	进场, 办公住宿设施安排	1 工作日	2017年10月26日	2017年10月26日										
4	人员、材料准备	1 工作日	2017年10月27日	2017年10月27日										
5	技术准备深化设计	5 工作日	2017年10月27日	2017年10月31日										
6	2#仓库进度计划	258 工作日	2017年11月05日	2018年07月20日										
7	电气系统	258 工作日	2017年11月05日	2018年07月20日										
8	桥架敷设	22 工作日	2018年05月05日	2018年05月26日										
9	电线电缆敷设	23 工作日	2018年05月21日	2018年06月12日										
10	配电柜及灯具安装	21 工作日	2018年05月31日	2018年06月20日										
11	防雷接地系统	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
12	系统接驳及调试	30 工作日	2018年06月21日	2018年07月20日										
13	给排水系统安装	106 工作日	2017年11月30日	2018年03月15日										
14	管路预埋	31 工作日	2017年11月30日	2017年12月30日										
15	管路安装	13 工作日	2018年03月01日	2018年03月13日										
16	试压及冲洗	2 工作日	2018年03月14日	2018年03月15日										
17	洁具安装	10 工作日	2018年03月06日	2018年03月15日										
18	通风空调系统安装	80 工作日	2018年03月20日	2018年06月07日										
19	风管安装	39 工作日	2018年03月20日	2018年04月27日										
20	设备安装	28 工作日	2018年05月01日	2018年05月28日										
21	系统调试	10 工作日	2018年05月29日	2018年06月07日										
22	火灾自动报警系统安装	82 工作日	2018年03月20日	2018年06月09日										
23	管线敷设	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
24	末端设备安装	61 工作日	2018年03月21日	2018年05月20日										
25	系统测试调试	20 工作日	2018年05月21日	2018年06月09日										
26	消防及喷淋系统	100 工作日	2018年03月20日	2018年06月27日										
27	管路安装	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
28	试压及冲洗	5 工作日	2018年05月21日	2018年05月25日										
29	喷头安装	13 工作日	2018年05月26日	2018年06月07日										
30	消防箱安装	20 工作日	2018年06月08日	2018年06月27日										
31	3#仓库进度计划	256 工作日	2017年11月05日	2018年07月18日										
32	电气系统	256 工作日	2017年11月05日	2018年07月18日										
33	桥架敷设	22 工作日	2018年05月05日	2018年05月26日										
34	电线电缆敷设	23 工作日	2018年05月21日	2018年06月12日										
35	配电柜及灯具安装	21 工作日	2018年05月31日	2018年06月20日										
36	防雷接地系统	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
37	系统接驳及调试	28 工作日	2018年06月21日	2018年07月18日										
38	给排水系统安装	131 工作日	2017年11月05日	2018年03月15日										
39	管路预埋	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
40	管路安装	13 工作日	2018年03月01日	2018年03月13日										
41	试压及冲洗	2 工作日	2018年03月14日	2018年03月15日										
42	洁具安装	10 工作日	2018年03月06日	2018年03月15日										
43	通风空调系统安装	80 工作日	2018年03月20日	2018年06月07日										
44	风管安装	39 工作日	2018年03月20日	2018年04月27日										
45	设备安装	28 工作日	2018年05月01日	2018年05月28日										
46	系统调试	10 工作日	2018年05月29日	2018年06月07日										
47	火灾自动报警系统安装	82 工作日	2018年03月20日	2018年06月09日										
48	管线敷设	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
49	末端设备安装	61 工作日	2018年03月21日	2018年05月20日										
50	系统测试调试	20 工作日	2018年05月21日	2018年06月09日										
51	消防及喷淋系统	100 工作日	2018年03月20日	2018年06月27日										
52	管路安装	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										

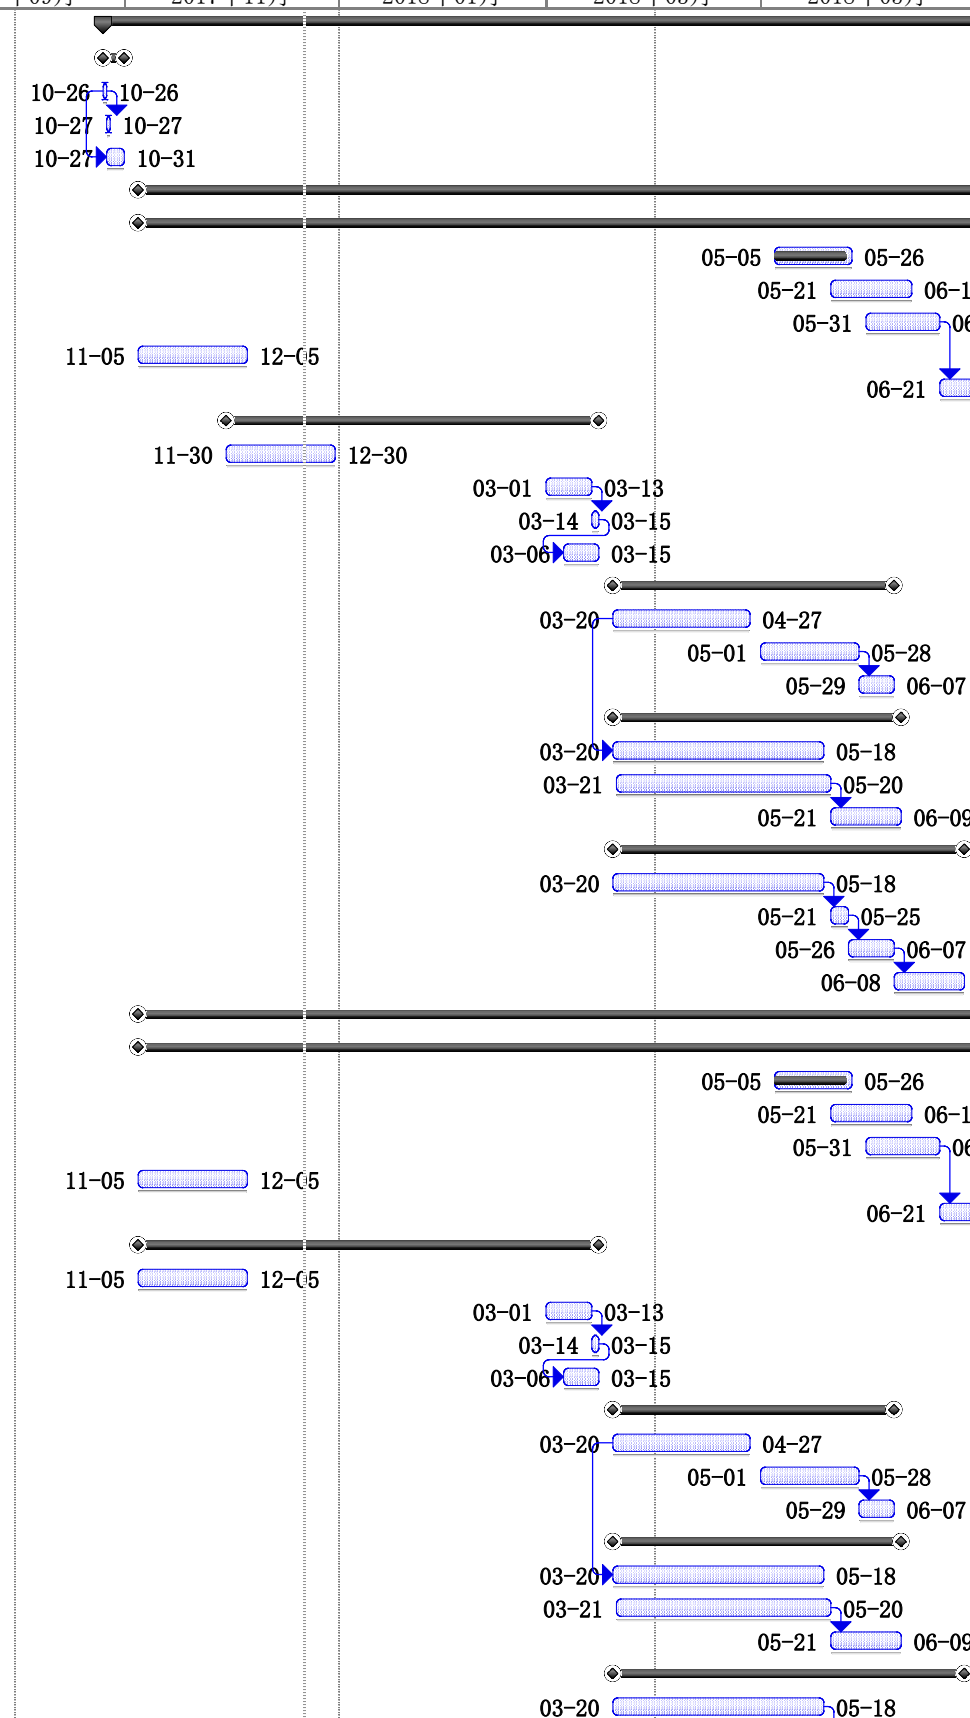

项目: 安装专业
日期: 2017年12月22日

任务 里程碑 总成型任务 总成型进度 外部任务 摘要分组
 进度 摘要 总成型里程碑 拆分 项目摘要 期限

施工进度计划

唯品会华东运营总部项目一期工程一标段施工总承包工程（安装部分）

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	第二季度		第三季度		第四季度		第一季度		第二季度	
					2017年03月	2017年05月	2017年07月	2017年09月	2017年11月	2018年01月	2018年03月	2018年05月		
53	试压及冲洗	5 工作日	2018年05月21日	2018年05月25日										05-21 05-25
54	喷头安装	13 工作日	2018年05月26日	2018年06月07日										05-26 06-07
55	消防箱安装	20 工作日	2018年06月08日	2018年06月27日										06-08
56	品骏分拣中心进度计划	254 工作日	2017年11月05日	2018年07月16日										
57	电气系统	254 工作日	2017年11月05日	2018年07月16日										
58	桥架敷设	22 工作日	2018年05月05日	2018年05月26日										05-05 05-26
59	电线电缆敷设	23 工作日	2018年05月21日	2018年06月12日										05-21 06-1
60	配电柜及灯具安装	21 工作日	2018年05月31日	2018年06月20日										05-31 06
61	防雷接地系统	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
62	系统接驳及调试	26 工作日	2018年06月21日	2018年07月16日										06-21
63	给排水系统安装	106 工作日	2017年11月30日	2018年03月15日										
64	管路预埋	31 工作日	2017年11月30日	2017年12月30日										
65	管路安装	13 工作日	2018年03月01日	2018年03月13日										
66	试压及冲洗	2 工作日	2018年03月14日	2018年03月15日										
67	洁具安装	10 工作日	2018年03月06日	2018年03月15日										
68	通风空调系统安装	80 工作日	2018年03月20日	2018年06月07日										
69	风管安装	39 工作日	2018年03月20日	2018年04月27日										
70	设备安装	28 工作日	2018年05月01日	2018年05月28日										
71	系统调试	10 工作日	2018年05月29日	2018年06月07日										
72	火灾自动报警系统安装	82 工作日	2018年03月20日	2018年06月09日										
73	管线敷设	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
74	末端设备安装	61 工作日	2018年03月21日	2018年05月20日										
75	系统测试调试	20 工作日	2018年05月21日	2018年06月09日										
76	消防及喷淋系统	100 工作日	2018年03月20日	2018年06月27日										
77	管路安装	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
78	试压及冲洗	5 工作日	2018年05月21日	2018年05月25日										
79	喷头安装	13 工作日	2018年05月26日	2018年06月07日										
80	消防箱安装	20 工作日	2018年06月08日	2018年06月27日										
81	唯品会分拣中心进度计划	255 工作日	2017年11月05日	2018年07月17日										
82	电气系统	255 工作日	2017年11月05日	2018年07月17日										
83	桥架敷设	22 工作日	2018年05月05日	2018年05月26日										
84	电线电缆敷设	23 工作日	2018年05月21日	2018年06月12日										
85	配电柜及灯具安装	21 工作日	2018年05月31日	2018年06月20日										
86	防雷接地系统	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
87	系统接驳及调试	27 工作日	2018年06月21日	2018年07月17日										
88	给排水系统安装	131 工作日	2017年11月05日	2018年03月15日										
89	管路预埋	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
90	管路安装	13 工作日	2018年03月01日	2018年03月13日										
91	试压及冲洗	2 工作日	2018年03月14日	2018年03月15日										
92	洁具安装	10 工作日	2018年03月06日	2018年03月15日										
93	通风空调系统安装	80 工作日	2018年03月20日	2018年06月07日										
94	风管安装	39 工作日	2018年03月20日	2018年04月27日										
95	设备安装	28 工作日	2018年05月01日	2018年05月28日										
96	系统调试	10 工作日	2018年05月29日	2018年06月07日										
97	火灾自动报警系统安装	82 工作日	2018年03月20日	2018年06月09日										
98	管线敷设	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
99	末端设备安装	61 工作日	2018年03月21日	2018年05月20日										
100	系统测试调试	20 工作日	2018年05月21日	2018年06月09日										
101	消防及喷淋系统	100 工作日	2018年03月20日	2018年06月27日										
102	管路安装	60 工作日	2018年03月20日	2018年05月18日										
103	试压及冲洗	5 工作日	2018年05月21日	2018年05月25日										
104	喷头安装	13 工作日	2018年05月26日	2018年06月07日										

项目：安装专业
日期：2017年12月22日

任务 进度

里程碑 摘要

总成型任务 总成型里程碑

总成型进度 拆分


外部任务 项目摘要

摘要分组 期限

施工进度计划

唯品会华东运营总部项目一期工程一标段施工总承包工程（安装部分）

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	第二季度		第三季度		第四季度		第一季度		第二季度	
					2017年03月	2017年05月	2017年07月	2017年09月	2017年11月	2018年01月	2018年03月	2018年05月		
105	消防箱安装	20 工作日	2018年06月08日	2018年06月27日										06-08
106	综合楼进度计划	197 工作日	2017年11月05日	2018年05月20日										
107	电气系统	197 工作日	2017年11月05日	2018年05月20日										
108	线管预埋	21 工作日	2017年11月20日	2017年12月10日										
109	电线电缆敷设	103 工作日	2017年12月20日	2018年04月01日										
110	配电柜及灯具安装	48 工作日	2018年04月01日	2018年05月18日										
111	防雷接地系统	31 工作日	2017年11月05日	2017年12月05日										
112	系统接驳及调试	6 工作日	2018年05月15日	2018年05月20日										
113	给排水系统安装	138 工作日	2017年11月15日	2018年04月01日										
114	管路预埋	31 工作日	2017年11月15日	2017年12月15日										
115	管路安装	49 工作日	2018年01月31日	2018年03月20日										
116	试压及冲洗	3 工作日	2018年03月20日	2018年03月22日										
117	洁具安装	10 工作日	2018年03月23日	2018年04月01日										
118	通风空调系统安装	131 工作日	2018年01月10日	2018年05月20日										
119	风管安装	70 工作日	2018年01月10日	2018年03月20日										
120	设备安装	74 工作日	2018年02月01日	2018年04月15日										
121	系统调试	10 工作日	2018年05月11日	2018年05月20日										
122	火灾自动报警系统安装	131 工作日	2018年01月10日	2018年05月20日										
123	管线敷设	65 工作日	2018年01月10日	2018年03月15日										
124	末端设备安装	31 工作日	2018年04月15日	2018年05月15日										
125	系统测试调试	6 工作日	2018年05月15日	2018年05月20日										
126	消防及喷淋系统	105 工作日	2018年01月31日	2018年05月15日										
127	管路安装	49 工作日	2018年01月31日	2018年03月20日										
128	试压及冲洗	10 工作日	2018年03月21日	2018年03月30日										
129	喷头安装	21 工作日	2018年03月21日	2018年04月10日										
130	消防箱安装	20 工作日	2018年04月26日	2018年05月15日										
131	变电站、门卫、司机休息室、	30 工作日	2018年03月21日	2018年04月19日										
132	管道工程	30 工作日	2018年03月21日	2018年04月19日										
133	电气工程	30 工作日	2018年03月21日	2018年04月19日										
134	室外综合管线	130 工作日	2018年01月01日	2018年05月10日										
135	室外雨水管道施工	115 工作日	2018年01月01日	2018年04月25日										
136	室外污水管道施工	115 工作日	2018年01月01日	2018年04月25日										
137	室外消防管道施工	61 工作日	2018年03月11日	2018年05月10日										
138	室外检查井施工	115 工作日	2018年01月06日	2018年04月30日										
139	竣工验收	12 工作日	2018年07月17日	2018年07月28日										
140	防雷装置竣工验收	2 工作日	2018年07月17日	2018年07月18日										
141	消防检测	3 工作日	2018年07月22日	2018年07月24日										
142	联合调试及消防验收	1 工作日	2018年07月27日	2018年07月27日										
143	系统验收交接	2 工作日	2018年07月27日	2018年07月28日										

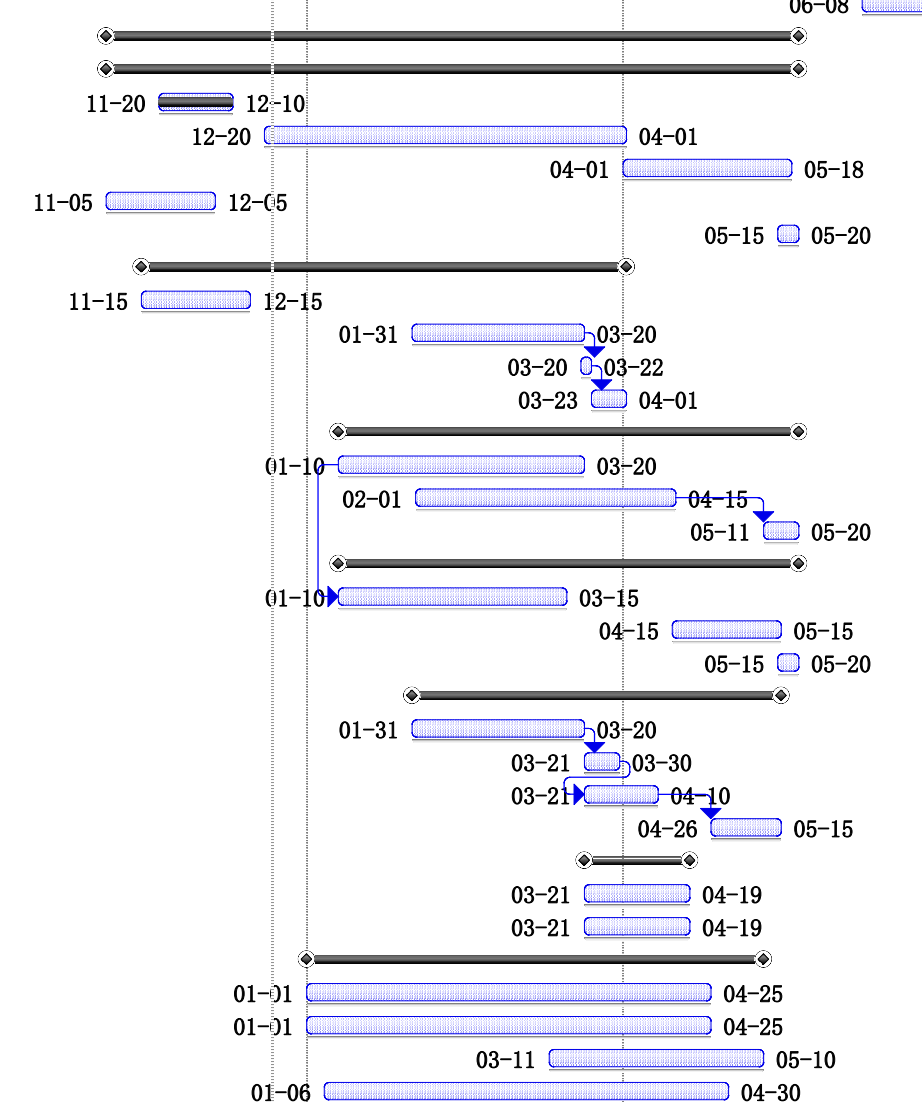

项目：安装专业
日期：2017年12月22日

任务进度 里程碑 总成型任务 总成型进度 外部任务 摘要分组
 进度 摘要 总成型里程碑 拆分 项目摘要 期限
