


标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	04月30日						2017年05月07日						2017	
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1	武汉金龙形象进度计划20170522	80 工作日	2017年05月03日	2017年07月21日														
2	一、给排水工程	49 工作日	2017年05月03日	2017年06月20日														
3	5、6、7号卫生间排水安装	11 工作日	2017年05月25日	2017年06月04日														
4	5、6、7号卫生间给水安装	13 工作日	2017年05月29日	2017年06月10日														
5	5、6、7号卫生间洁具安装	5 工作日	2017年06月15日	2017年06月19日														
6	1-20轴/N轴自重流雨水安装	7 工作日	2017年05月25日	2017年05月31日														
7	1、3轴虹吸出户预埋安装	2 工作日	2017年05月03日	2017年05月04日														
8	1-20轴虹吸雨水管道安装	9 工作日	2017年05月25日	2017年06月02日														
9	20-33轴/N轴自重流雨水安装	5 工作日	2017年06月02日	2017年06月06日														
10	20-33轴虹吸雨水管道安装	7 工作日	2017年06月04日	2017年06月10日														
11	33-50轴/N轴自重流雨水安装	7 工作日	2017年06月08日	2017年06月14日														
12	33-50轴虹吸雨水管道安装	9 工作日	2017年06月12日	2017年06月20日														
13	二、电气工程	46 工作日	2017年05月25日	2017年07月09日														
14	1-20轴桥架安装	4 工作日	2017年05月25日	2017年05月28日														
15	1-20轴配管、穿线	6 工作日	2017年05月30日	2017年06月04日														
16	1-20轴灯具安装	1 工作日	2017年06月06日	2017年06月06日														
17	20-33轴桥架安装	7 工作日	2017年06月06日	2017年06月12日														
18	20-33轴配管、穿线	6 工作日	2017年06月14日	2017年06月19日														
19	20-33轴灯具安装	5 工作日	2017年06月13日	2017年06月17日														
20	33-50轴桥架安装	4 工作日	2017年06月16日	2017年06月19日														
21	33-50轴配管、穿线	5 工作日	2017年06月21日	2017年06月25日														
22	33-50轴灯具安装	4 工作日	2017年06月27日	2017年06月30日														
23	1-33轴电箱安装	1 工作日	2017年06月12日	2017年06月12日														
24	33-50轴电箱安装	1 工作日	2017年06月18日	2017年06月18日														
25	1-33轴电缆敷设	6 工作日	2017年06月27日	2017年07月02日														
26	33-50轴电缆敷设	6 工作日	2017年07月04日	2017年07月09日														
27	三、调试竣工阶段	28 工作日	2017年06月24日	2017年07月21日														
28	卫生间洁具调试	1 工作日	2017年06月24日	2017年06月24日														
29	干线送电调试	1 工作日	2017年07月14日	2017年07月14日														
30	照明送电调试	1 工作日	2017年07月17日	2017年07月17日														
31	质检验收	1 工作日	2017年07月19日	2017年07月19日														
32	竣工资料整理	9 工作日	2017年07月11日	2017年07月19日														
33	工程交接验收	1 工作日	2017年07月21日	2017年07月21日														

项目：项目1
日期：2017年12月21日


- 任务 里程碑
- 拆分 摘要
- 进度 项目摘要
- 外部任务
- 外部里程碑
- 期限

05月14日						2017年05月21日						2017年05月28日						2017年06月04日						2017年06月11日						2017				
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

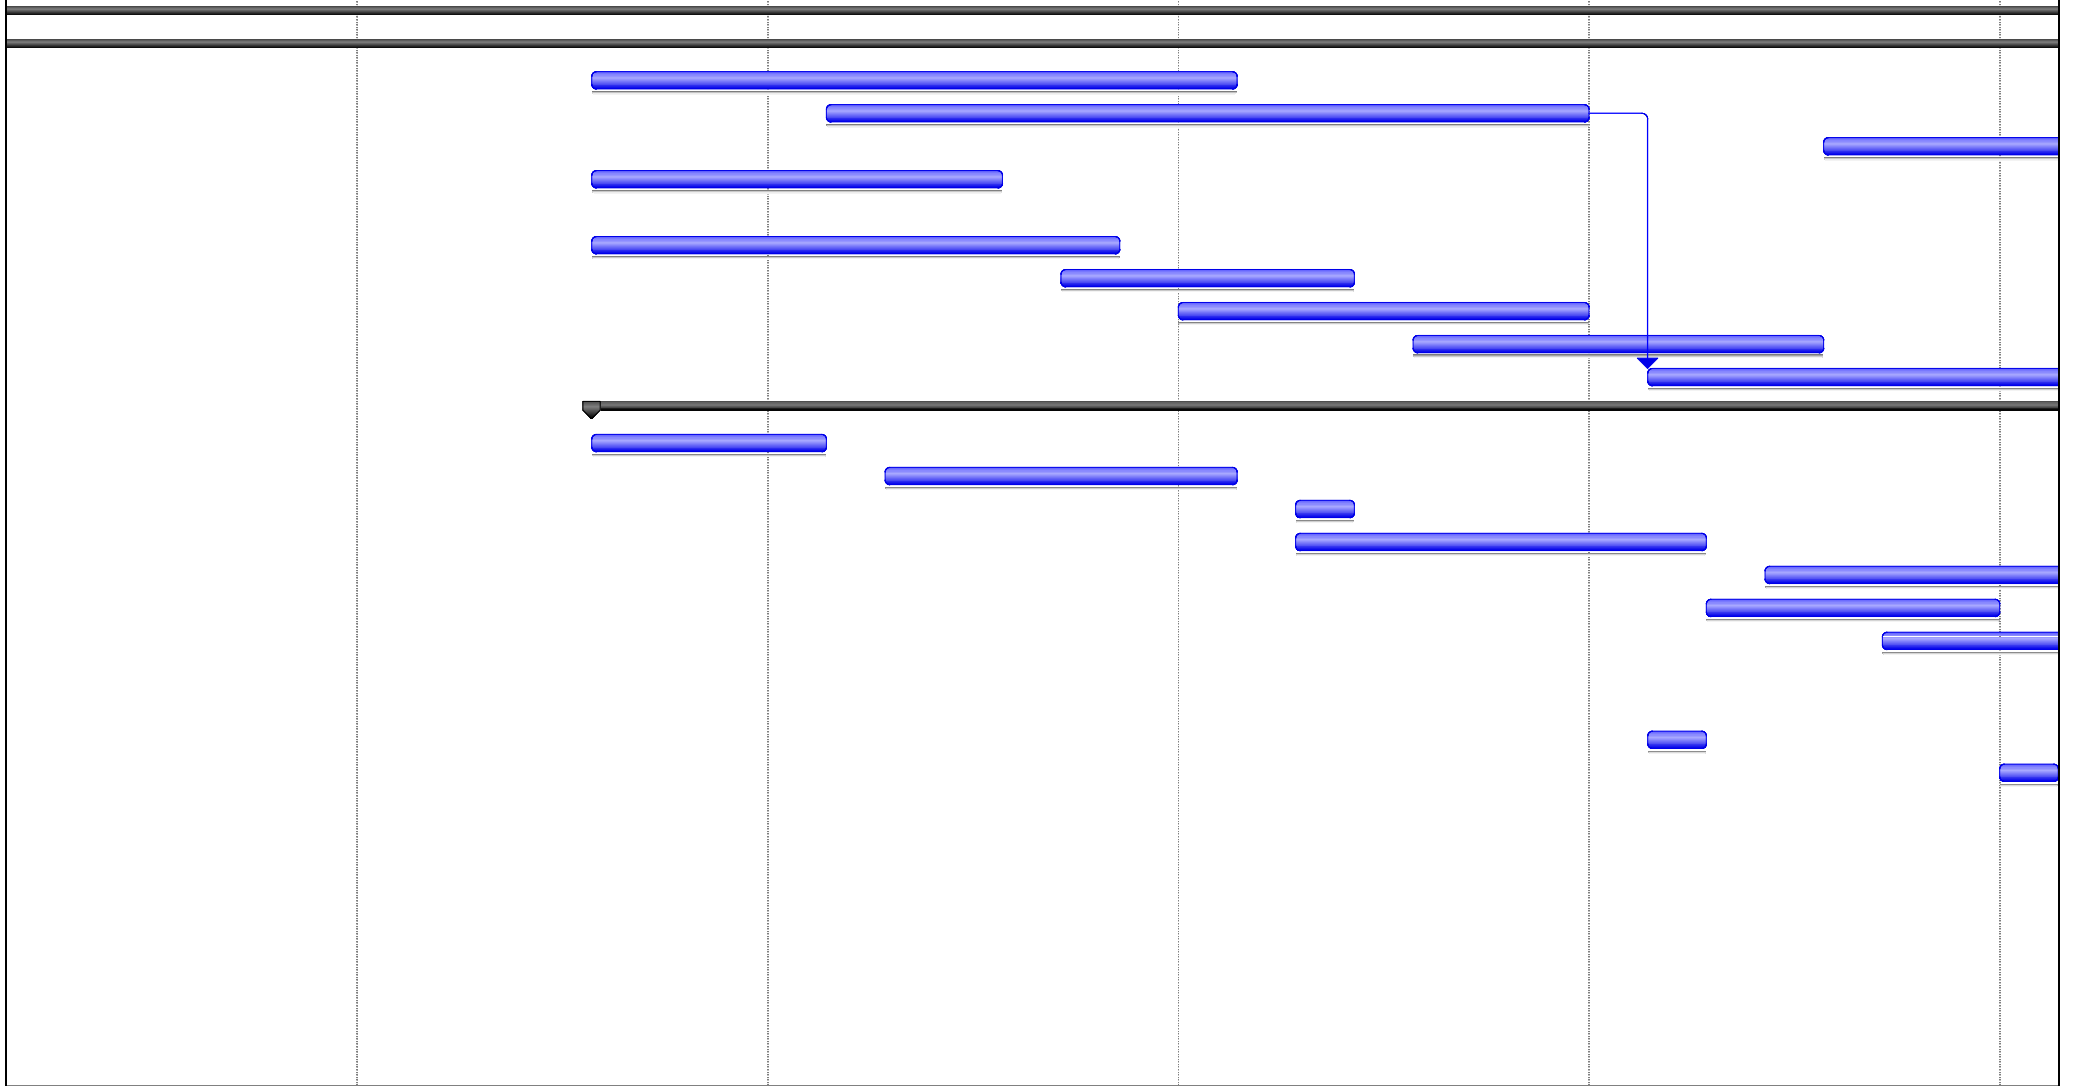

项目：项目1 日期：2017年12月21日	任务		里程碑		外部任务	
	拆分		摘要		外部里程碑	
	进度		项目摘要		期限	

06月18日						2017年06月25日						2017年07月02日						2017年07月09日						2017年07月16日						2017				
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

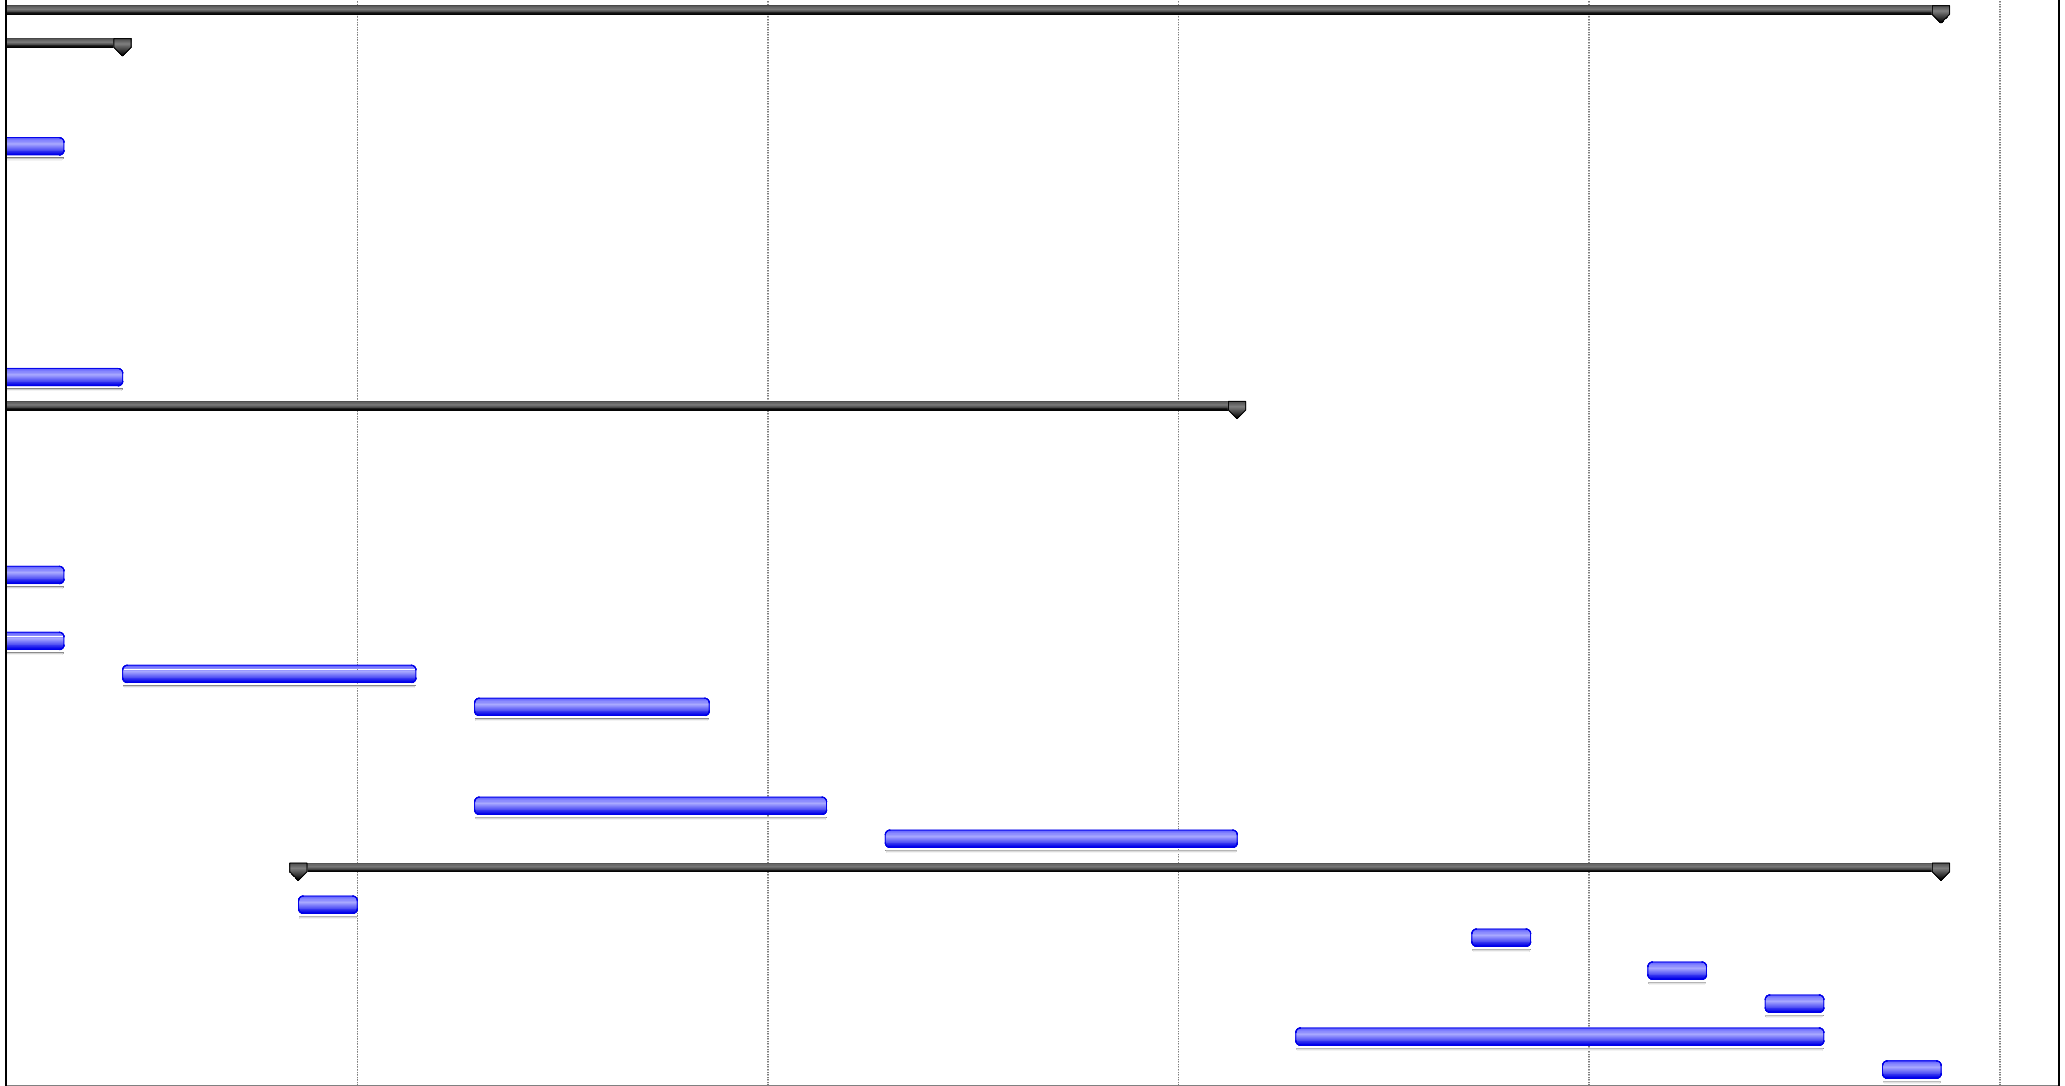

项目：项目1 日期：2017年12月21日	任务		里程碑		外部任务	
	拆分		摘要		外部里程碑	
	进度		项目摘要		期限	
