

湖州唯品会B地块施工总进度计划


标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018												一月	二月
							一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
1	B1标段施工总进度计划	391 个工作日?	2018年01月18日	2019年02月20日			◆ 01-18													
2	B1标段施工总进度计划	0 个工作日?	2018年01月18日	2018年01月18日																
3	B1标段施工总进度计划	0 个工作日?	2019年02月20日	2019年02月20日																◆ 02-20
4	桩基工程	111 个工作日	2018年03月20日	2018年07月08日			◆ 03-20													
26	桩基工程	0 个工作日?	2018年03月20日	2018年03月20日																
27	桩基工程	0 个工作日?	2018年09月15日	2018年09月15日																
28	办公楼	231 个工作日	2018年04月08日	2018年11月24日			◆ 09-15													
29	基础施工	30 个工作日	2018年04月08日	2018年05月07日																
30	承台、地梁施工及回填、垫层施工	30 个工作日	2018年04月08日	2018年05月07日																
31	主体施工	95 个工作日	2018年06月08日	2018年09月10日																
32	4.45梁板柱浇筑	15 个工作日	2018年06月08日	2018年06月22日																
33	8.95梁板柱浇筑	15 个工作日	2018年06月23日	2018年07月07日	32															
34	13.50梁板柱浇筑	15 个工作日	2018年07月08日	2018年07月22日	33															
35	一层墙体砌筑	15 个工作日	2018年07月28日	2018年08月11日	32FS+35 个工															
36	二层墙体砌筑	15 个工作日	2018年08月12日	2018年08月26日	33FS+35 个工															
37	三层墙体砌筑	15 个工作日	2018年08月27日	2018年09月10日	34FS+35 个工															
38	装修、机电安装	90 个工作日	2018年08月27日	2018年11月24日																
39	地坪浇筑	7 个工作日	2018年08月27日	2018年09月02日	35FS+15 个工															
40	门窗安装	20 个工作日	2018年09月18日	2018年10月07日	37FS+7 个工作															
41	内外装饰	90 个工作日	2018年08月27日	2018年11月24日	37FS-15 个工															
42	水电暖安装	60 个工作日	2018年09月21日	2018年11月19日	41SS+25 个工															
43	5号仓库	267 个工作日	2018年05月20日	2019年02月18日																
44	基础施工	80 个工作日	2018年05月20日	2018年08月07日																
45	基础承台、地梁挡土墙短柱施工、褥垫层及砼垫层	80 个工作日	2018年05月20日	2018年08月07日																
46	主体结构施工	170 个工作日	2018年08月10日	2019年01月26日																
47	11.40梁板柱浇筑、夹层施工	65 个工作日	2018年08月10日	2018年10月13日																
48	屋顶梁、柱浇筑	30 个工作日	2018年09月29日	2018年10月28日	47FS-15 个工															
49	外墙LAC板安装、雨棚施工	45 个工作日	2018年11月23日	2019年01月06日	48FS+25 个工	2组 每														
50	门窗安装	30 个工作日	2018年12月28日	2019年01月26日	49FS-10 个工															
51	一层地坪施工	20 个工作日	2018年12月08日	2018年12月27日	49FS-30 个工	未考虑														
52	一层二次结构内墙砌筑	30 个工作日	2018年10月15日	2018年11月13日																
53	二层二次结构内墙砌筑	30 个工作日	2018年12月16日	2019年01月14日	51FS-12 个工															
54	屋面钢梁、檩条安装	25 个工作日	2018年12月03日	2018年12月27日	48FS+35 个工	2台12														
55	屋面板安装	25 个工作日	2018年12月23日	2019年01月16日	54FS-5 个工作	屋面木														
56	装修、机电施工	90 个工作日	2018年11月13日	2019年02月18日																
57	内外装饰	80 个工作日	2018年11月23日	2019年02月18日	49SS															
58	机电安装	90 个工作日	2018年11月13日	2019年02月18日	57SS-10 个工															
59	6号仓库	219 个工作日	2018年07月08日	2019年02月19日																
60	基础施工	70 个工作日	2018年07月08日	2018年09月15日																
61	基础承台、地梁挡土墙短柱施工、褥垫层及砼垫层	70 个工作日	2018年07月08日	2018年09月15日	14FS+7 个工作															
62	主体结构施工	155 个工作日	2018年09月10日	2019年02月19日																
63	11.40梁板柱浇筑、夹层施工	65 个工作日	2018年09月10日	2018年11月13日	61SS+50 个工作															
64	屋顶梁、柱浇筑	30 个工作日	2018年10月30日	2018年11月28日	63FS-15 个工															
65	外墙LAC板安装、雨棚施工	45 个工作日	2018年12月29日	2019年02月19日	64FS+30 个工	2组 每														
66	门窗安装	25 个工作日	2019年01月18日	2019年02月19日	65FS-25 个工															
67	一层地坪施工	20 个工作日	2019年01月13日	2019年02月01日	65FS-30 个工	未考虑														
68	一层二次结构内墙砌筑	30 个工作日	2018年12月14日	2019年01月12日	63FS+30 个工															

项目：总进度计划
日期：2018年08月16日

任务	项目摘要	非活动摘要	手动摘要	外部里程碑
拆分	外部任务	手动任务	仅开始时间	进度
里程碑	外部里程碑	仅工期	仅完成时间	期限
摘要	非活动里程碑	手动摘要总成	外部任务	

湖州唯品会B地块施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018												一月	二月		
							一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月				
116	水电暖安装	75 个工作日	2018年10月19日	2019年01月01日	111																	
117	变电房垃圾房、公厕及司机休息室	114 个工作日	2018年08月20日	2018年12月11日																		
118	承台、地梁施工	4 个工作日	2018年08月20日	2018年08月23日	10FS+28 个工																	
119	梁板柱浇筑	10 个工作日	2018年08月24日	2018年09月02日	118																	
120	墙体砌筑	10 个工作日	2018年10月03日	2018年10月12日	119FS+30 个工																	
121	地坪浇筑	4 个工作日	2018年10月13日	2018年10月16日	120																	
122	门窗安装	10 个工作日	2018年10月17日	2018年10月26日	121																	
123	内外装饰	60 个工作日	2018年10月13日	2018年12月11日	120																	
124	水电暖安装	60 个工作日	2018年10月13日	2018年12月11日	120																	
125	门卫3	99 个工作日	2018年09月01日	2018年12月08日																		
126	承台、地梁施工	4 个工作日	2018年09月01日	2018年09月04日	10FS+20 个工																	
127	梁板柱浇筑	10 个工作日	2018年09月05日	2018年09月14日	126																	
128	墙体砌筑	10 个工作日	2018年10月15日	2018年10月24日	127FS+30 个工																	
129	地坪浇筑	4 个工作日	2018年10月25日	2018年10月28日	128																	
130	门窗安装	15 个工作日	2018年10月25日	2018年11月08日	128																	
131	内外装饰	45 个工作日	2018年10月25日	2018年12月08日	128																	
132	水电暖安装	30 个工作日	2018年10月25日	2018年11月23日	128																	
133	门卫2	259 个工作日	2018年01月18日	2018年10月03日																		
134	承台、地梁施工	7 个工作日	2018年01月18日	2018年01月24日																		
135	梁板柱浇筑	10 个工作日	2018年01月29日	2018年02月07日																		
136	墙体砌筑	12 个工作日	2018年04月26日	2018年05月07日																		
137	地坪浇筑	4 个工作日	2018年07月25日	2018年07月28日	136																	
138	门窗安装	5 个工作日	2018年07月20日	2018年07月24日	136FS+12 个工																	
139	内外装饰	45 个工作日	2018年08月20日	2018年10月03日	136FS+12 个工																	
140	水电暖安装	30 个工作日	2018年07月20日	2018年08月18日	136FS+10 个工																	
141	变电站1、2	105 个工作日	2018年09月15日	2018年12月28日																		
142	承台、地梁施工	15 个工作日	2018年09月15日	2018年09月29日	9FS+28 个工作																	
143	梁板柱浇筑	15 个工作日	2018年09月30日	2018年10月14日	142																	
144	墙体砌筑	15 个工作日	2018年11月14日	2018年11月28日	143FS+30 个工																	
145	电缆沟砌筑及地坪浇筑	30 个工作日	2018年11月29日	2018年12月28日	144																	
146	门窗安装	5 个工作日	2018年11月29日	2018年12月03日	144																	
147	内外装饰	15 个工作日	2018年12月06日	2018年12月20日	144FS+7 个工																	
148	水电暖安装	30 个工作日	2018年11月29日	2018年12月28日	144																	
149	公厕及司机休息室	109 个工作日	2018年09月15日	2019年01月01日																		
150	承台、地梁施工	7 个工作日	2018年09月15日	2018年09月21日	10FS+28 个工																	
151	梁板柱浇筑	10 个工作日	2018年09月22日	2018年10月01日	150																	
152	墙体砌筑	10 个工作日	2018年11月01日	2018年11月10日	151FS+30 个工																	
153	土方回填及地坪浇筑	4 个工作日	2018年11月11日	2018年11月14日	152																	
154	门窗安装	5 个工作日	2018年11月11日	2018年11月15日	152																	
155	内外装饰	45 个工作日	2018年11月18日	2019年01月01日	152FS+7 个工																	
156	水电暖安装	30 个工作日	2018年11月11日	2018年12月10日	152																	
157	室外总体	345 个工作日	2018年02月20日	2019年01月30日																		
158	围墙施工	270 个工作日	2018年03月03日	2018年11月27日																		
159	室外雨水、污水、消防等	200 个工作日	2018年07月15日	2019年01月30日																		
160	完工	1 个工作日	2018年02月20日	2018年02月20日																		

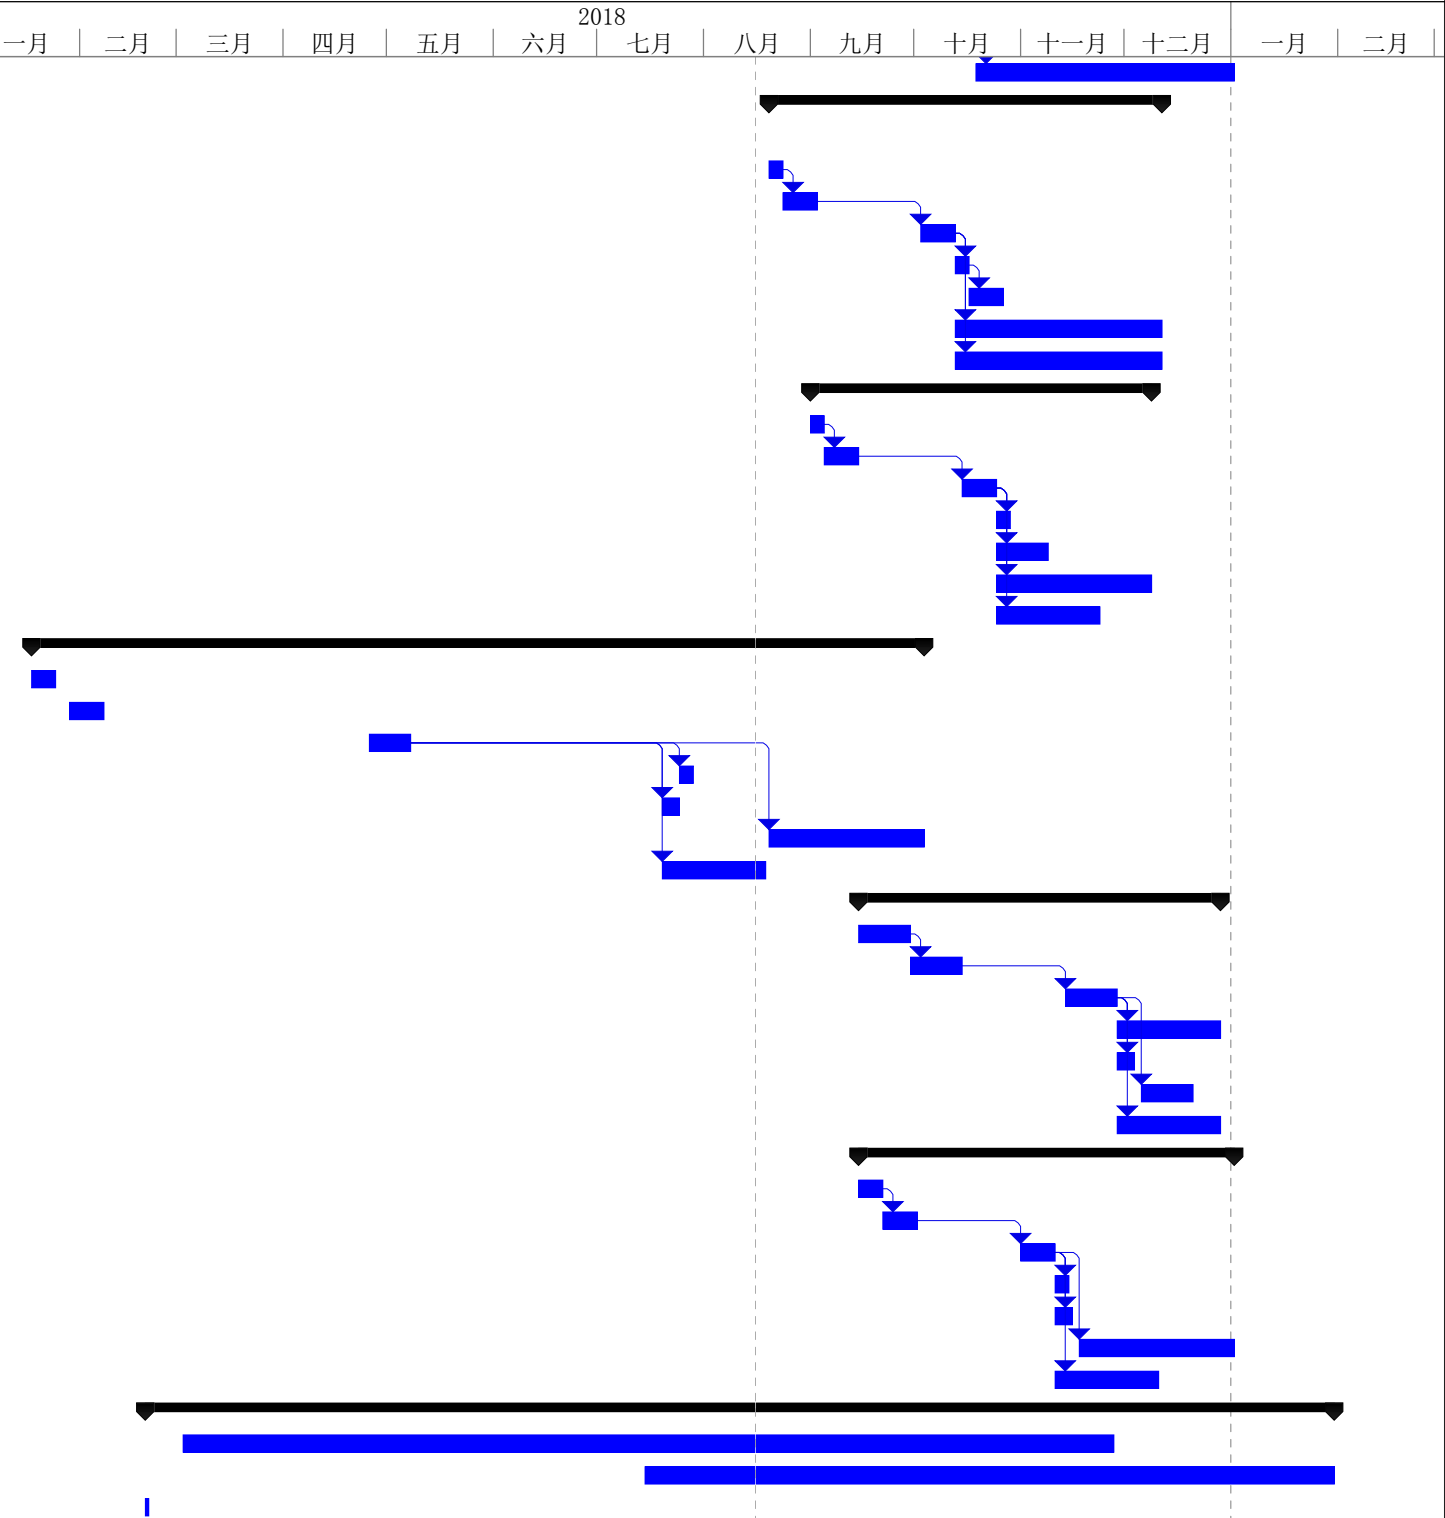

项目：总进度计划 日期：2018年08月16日	任务 拆分 里程碑 摘要		项目摘要 外部任务 外部里程碑 非活动里程碑		非活动摘要 手动任务 仅工期 手动摘要总成		手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	外部里程碑 进度 期限	
----------------------------	-----------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	-------------------	--
