施工进度计划

建设单位: 上海太江建设工程有限公司

乐歌杭州现代物流产业园暨电子商务安全产业链服务示范园项目

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称
1	**乐歌物流园项目施工进度**	**个工作日134**	**年05月15日2018**	**年09月25日2018**	
2	**1、现场施工**	**个工作日109**	**年05月15日2018**	**年08月31日2018**	
3	**给排水系统**	**个工作日109**	**年05月15日2018**	**年08月31日2018**	
4	1#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年05月17日2018	年05月18日2018	
5	1#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年05月19日2018	年05月20日2018	
6	1#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年05月21日2018	年05月23日2018	
7	1#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年05月24日2018	年05月26日2018	24日增加升降车2台
8	1物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日10	年05月19日2018	年05月28日2018	
9	1物流仓库给排水管路安装	个工作日12	年05月20日2018	年05月31日2018	
10	1物流仓库洁具安装	个工作日17	年07月15日2018	年07月31日2018	
11	2#仓库一层东南角给排水预埋	个工作日3	年05月23日2018	年05月25日2018	
12	2#仓库一层东北角给排水预埋	个工作日3	年05月26日2018	年05月28日2018	
13	2#仓库一层西南角给排水预埋	个工作日2	年05月29日2018	年05月30日2018	
14	2#仓库一层西北角给排水预埋	个工作日2	年05月31日2018	年06月01日2018	
15	2#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月06日2018	年06月08日2018	
16	2#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月09日2018	年06月11日2018	
17	2#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年06月12日2018	年06月13日2018	
18	2#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年06月13日2018	年06月14日2018	
19	2物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日9	年06月17日2018	年06月25日2018	
20	2物流仓库给排水管路安装	个工作日21	年06月20日2018	年07月10日2018	
21	2物流仓库洁具安装	个工作日17	年07月15日2018	年07月31日2018	
22	3#仓库一层东南角给排水预埋	个工作日3	年06月11日2018	年06月13日2018	
23	3#仓库一层东北角给排水预埋	个工作日3	年06月14日2018	年06月16日2018	
24	3#仓库一层西南角给排水预埋	个工作日2	年06月18日2018	年06月19日2018	
25	3#仓库一层西北角给排水预埋	个工作日2	年06月20日2018	年06月21日2018	
26	3#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月23日2018	年06月25日2018	
27	3#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月26日2018	年06月28日2018	
28	3#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年06月29日2018	年06月30日2018	
29	3#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年07月01日2018	年07月02日2018	
30	3物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日6	年08月10日2018	年08月15日2018	
31	3物流仓库给排水管路安装	个工作日11	年08月15日2018	年08月25日2018	
32	3物流仓库洁具安装	个工作日14	年08月18日2018	年08月31日2018	
33	4#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年05月27日2018	年05月28日2018	
34	4#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年05月29日2018	年05月30日2018	
35	4#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年05月31日2018	年06月02日2018	
36	4#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月03日2018	年06月05日2018	
37	4物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日21	年05月26日2018	年06月15日2018	
38	4物流仓库给排水管路安装	个工作日21	年06月10日2018	年06月30日2018	
39	4物流仓库洁具安装	个工作日17	年07月15日2018	年07月31日2018	
40	5#仓库一层东南角给排水预埋	个工作日5	年05月15日2018	年05月19日2018	
41	5#仓库一层东北角给排水预埋	个工作日4	年05月20日2018	年05月23日2018	
42	5#仓库一层西南角给排水预埋	个工作日2	年05月24日2018	年05月25日2018	
43	5#仓库一层西北角给排水预埋	个工作日2	年05月24日2018	年05月25日2018	
44	5#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年05月28日2018	年05月30日2018	
45	5#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年05月31日2018	年06月02日2018	
46	5#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月03日2018	年06月05日2018	
47	5#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日2	年06月06日2018	年06月07日2018	
48	5物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日16	年06月10日2018	年06月25日2018	
49	5物流仓库给排水管路安装	个工作日18	年07月01日2018	年07月18日2018	
50	5物流仓库洁具安装	个工作日17	年07月15日2018	年07月31日2018	

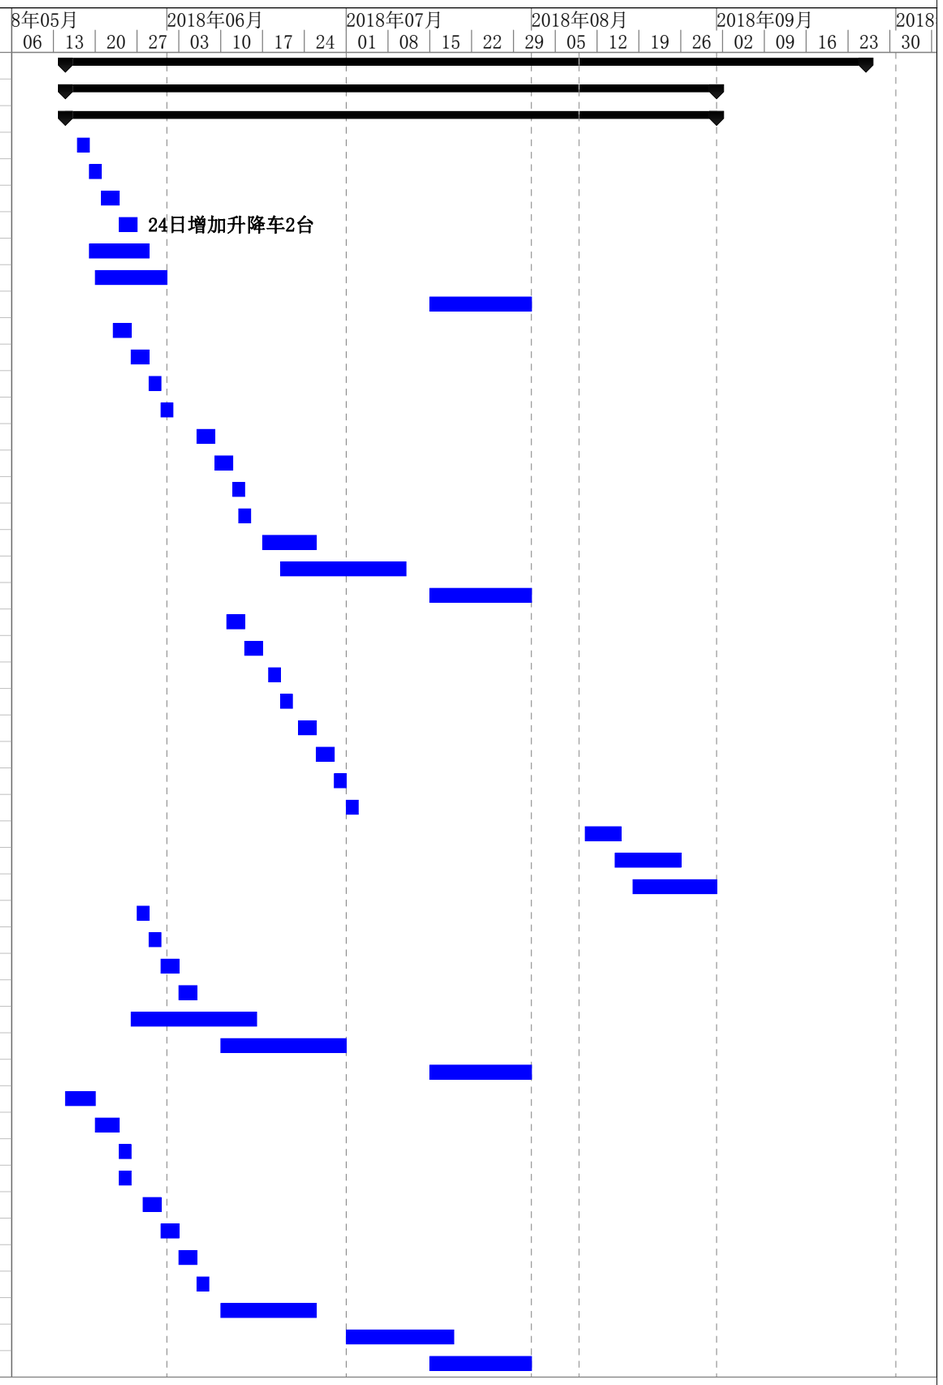

项目：乐歌工程进度计划
日期：2018年08月09日

任务 | 项目摘要 | 非活动摘要 | 手动摘要 | 外部里程碑
拆分 | 外部任务 | 手动任务 | 仅开始时间 | 进度
里程碑 | 外部里程碑 | 仅工期 | 仅完成时间 | 期限
摘要 | 非活动里程碑 | 手动摘要总成 | 外部任务

施工进度计划

建设单位: 上海太江建设工程有限公司

乐歌杭州现代物流产业园暨电子商务
安全产业链服务示范园项目

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称
51	6#仓库一层东南角给排水预埋	个工作日2	年05月26日2018	年05月27日2018	
52	6#仓库一层东北角给排水预埋	个工作日3	年05月28日2018	年05月30日2018	
53	6#仓库一层西南角给排水预埋	个工作日3	年05月31日2018	年06月02日2018	
54	6#仓库一层西北角给排水预埋	个工作日3	年06月03日2018	年06月05日2018	
55	6#仓库一层东南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月11日2018	年06月13日2018	
56	6#仓库一层东北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月12日2018	年06月14日2018	
57	6#仓库一层西南角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月15日2018	年06月17日2018	
58	6#仓库一层西北角防火分区管道支吊架制作及安	个工作日3	年06月18日2018	年06月20日2018	
59	6物流仓库二层给排水管路支吊架制作及安装	个工作日7	年08月01日2018	年08月07日2018	
60	6物流仓库给排水管路安装	个工作日13	年08月05日2018	年08月17日2018	
61	6物流仓库洁具安装	个工作日14	年08月18日2018	年08月31日2018	
62	倒班楼给排水施工	个工作日98	年05月26日2018	年08月31日2018	6月1日增加4人,陆续增加约至8-10人
63	3#/6#库东侧，6#库南侧室外管网施工	个工作日8	年05月18日2018	年05月25日2018	
64	1#库与4#库中部，3#库与6#库中部，室外管网施	个工作日5	年05月21日2018	年05月25日2018	
65	2#/3#库北侧室外管网施工	个工作日10	年05月31日2018	年06月09日2018	
66	1#库与2#库中部，4#库与5#库中部，室外管网施	个工作日15	年06月01日2018	年06月15日2018	
67	1#/4#库西侧室外管网施工	个工作日10	年06月16日2018	年06月25日2018	
68	2#库与3#库中部，5#库与6#库中部，室外管网施	个工作日10	年06月26日2018	年07月05日2018	
69	5#库南侧室外管网施工	个工作日5	年07月01日2018	年07月05日2018	
70	1#库北侧，4#库南侧，2#库与5#库中部室外管网	个工作日5	年07月06日2018	年07月10日2018	
71	电气系统	个工作日98	年05月15日2018	年08月20日2018	
72	1物流仓库预埋	个工作日7	年05月15日2018	年05月21日2018	
73	1#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月17日2018	年05月19日2018	
74	1#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月20日2018	年05月22日2018	
75	1#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月23日2018	年05月25日2018	24日增加6人,升降车3台
76	1#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月26日2018	年05月28日2018	
77	1物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日17	年05月20日2018	年06月05日2018	
78	1物流仓库桥架、线管安装	个工作日20	年05月31日2018	年06月19日2018	1日增加约10人,升降车增加2-4台
79	1物流仓库配电柜安装	个工作日3	年06月17日2018	年06月19日2018	
80	1物流仓库电线电缆敷设	个工作日26	年06月20日2018	年07月15日2018	
81	1物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日18	年07月01日2018	年07月18日2018	
82	1物流仓库电气调试	个工作日3	年07月16日2018	年07月18日2018	
83	2物流仓库预埋	个工作日7	年05月24日2018	年05月30日2018	
84	2#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月06日2018	年06月08日2018	
85	2#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月09日2018	年06月11日2018	
86	2#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月11日2018	年06月13日2018	
87	2#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月14日2018	年06月16日2018	
88	2物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日22	年06月03日2018	年06月24日2018	
89	2物流仓库桥架、线管安装	个工作日20	年06月08日2018	年06月27日2018	
90	2物流仓库配电柜安装	个工作日5	年06月23日2018	年06月27日2018	
91	2物流仓库电线电缆敷设	个工作日24	年06月25日2018	年07月18日2018	
92	2物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日18	年07月01日2018	年07月18日2018	
93	2物流仓库电气调试	个工作日4	年07月15日2018	年07月18日2018	
94	3物流仓库预埋	个工作日10	年06月11日2018	年06月20日2018	
95	3#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月23日2018	年06月25日2018	
96	3#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月26日2018	年06月28日2018	
97	3#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月29日2018	年07月01日2018	
98	3#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年07月02日2018	年07月04日2018	
99	3物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日23	年07月17日2018	年08月08日2018	
100	3物流仓库桥架、线管安装	个工作日39	年07月05日2018	年08月12日2018	

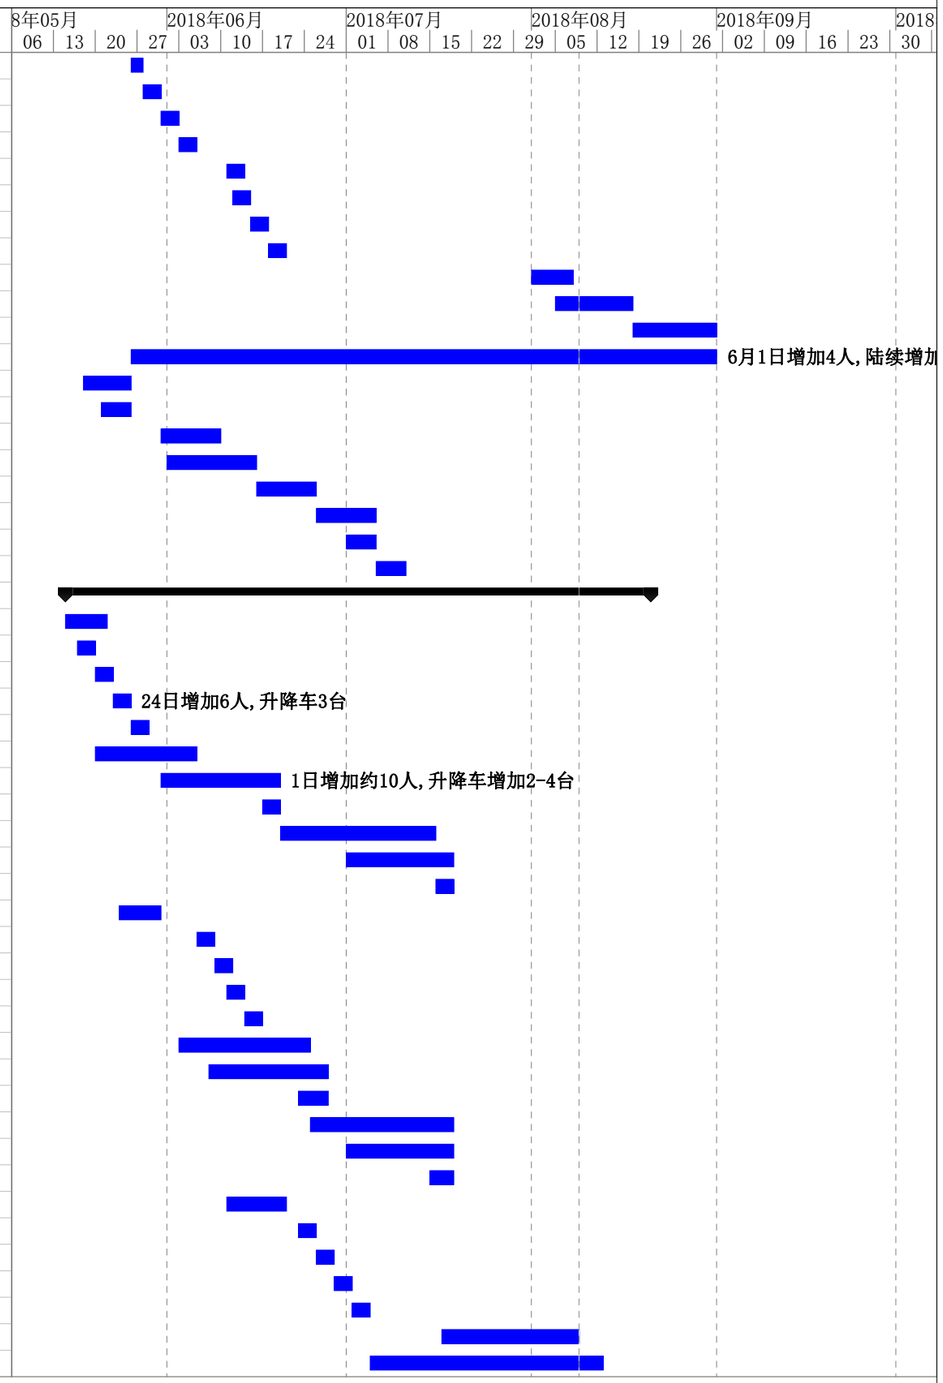

项目：乐歌工程进度计划
日期：2018年08月09日

任务		项目摘要		非活动摘要		手动摘要		外部里程碑	
拆分		外部任务		手动任务		仅开始时间		进度	
里程碑		外部里程碑		仅工期		仅完成时间		期限	
摘要		非活动里程碑		手动摘要总成		外部任务			

施工进度计划

建设单位: 上海太江建设工程有限公司

乐歌杭州现代物流产业园暨电子商务安全产业链服务示范园项目

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称
101	3物流仓库配电柜安装	个工作日5	年08月12日2018	年08月16日2018	
102	3物流仓库电线电缆敷设	个工作日27	年07月20日2018	年08月15日2018	
103	3物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日18	年08月01日2018	年08月18日2018	
104	3物流仓库电气调试	个工作日4	年08月15日2018	年08月18日2018	
105	4物流仓库预埋	个工作日9	年05月17日2018	年05月25日2018	
106	4#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月27日2018	年05月29日2018	
107	4#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月30日2018	年06月01日2018	
108	4#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月02日2018	年06月04日2018	
109	4#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月05日2018	年06月07日2018	
110	4物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日22	年05月22日2018	年06月12日2018	
111	4物流仓库桥架、线管安装	个工作日20	年06月08日2018	年06月27日2018	
112	4物流仓库配电柜安装	个工作日5	年06月23日2018	年06月27日2018	
113	4物流仓库电线电缆敷设	个工作日21	年06月28日2018	年07月18日2018	
114	4物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日18	年07月01日2018	年07月18日2018	
115	4物流仓库电气调试	个工作日4	年07月15日2018	年07月18日2018	
116	5物流仓库预埋	个工作日7	年05月18日2018	年05月24日2018	
117	5#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日2	年05月29日2018	年05月30日2018	28日电气又一班组进场,约10人,升降车增加4台
118	5#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年05月31日2018	年06月02日2018	
119	5#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月03日2018	年06月05日2018	
120	5#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月06日2018	年06月08日2018	
121	5物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日22	年06月03日2018	年06月24日2018	
122	5物流仓库桥架、线管安装	个工作日21	年06月10日2018	年06月30日2018	10日增加约8人,升降车增加2-4台
123	5物流仓库配电柜安装	个工作日5	年06月23日2018	年06月27日2018	
124	5物流仓库电线电缆敷设	个工作日18	年06月28日2018	年07月15日2018	
125	5物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日18	年07月01日2018	年07月18日2018	
126	5物流仓库电气调试	个工作日4	年07月15日2018	年07月18日2018	
127	6物流仓库预埋	个工作日7	年05月27日2018	年06月02日2018	
128	6#仓库一层东南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月11日2018	年06月13日2018	11日增加约10人
129	6#仓库一层东北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月12日2018	年06月14日2018	
130	6#仓库一层西南角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月15日2018	年06月17日2018	
131	6#仓库一层西北角防火分区电气支吊架制作及安	个工作日3	年06月18日2018	年06月20日2018	
132	6物流仓库二层支吊架制作安装	个工作日22	年07月02日2018	年07月23日2018	
133	6物流仓库桥架、线管安装	个工作日31	年06月28日2018	年07月28日2018	28日增加约8人
134	6物流仓库配电柜安装	个工作日5	年07月28日2018	年08月01日2018	
135	6物流仓库电线电缆敷设	个工作日27	年07月25日2018	年08月20日2018	
136	6物流仓库用电设备（灯具、插座等）安装	个工作日14	年08月05日2018	年08月18日2018	
137	6物流仓库电气调试	个工作日4	年08月15日2018	年08月18日2018	
138	倒班楼电气施工	个工作日49	年05月26日2018	年07月13日2018	
139	3#/6#库东侧，6#库南侧室外电气施工	个工作日8	年05月18日2018	年05月25日2018	
140	1#库与4#库中部，3#库与6#库中部，室外电气施	个工作日5	年05月21日2018	年05月25日2018	
141	2#/3#库北侧室外电气施工	个工作日10	年05月31日2018	年06月09日2018	
142	1#库与2#库中部，4#库与5#库中部，室外电气施	个工作日15	年06月01日2018	年06月15日2018	
143	1#/4#库西侧室外电气施工	个工作日10	年06月16日2018	年06月25日2018	
144	2#库与3#库中部，5#库与6#库中部，室外电气施	个工作日10	年06月26日2018	年07月05日2018	
145	5#库南侧室外电气施工	个工作日5	年07月01日2018	年07月05日2018	
146	1#库北侧，4#库南侧，2#库与5#库中部室外电气	个工作日5	年07月06日2018	年07月10日2018	
147	**4、竣工验收工程移交**	**个工作日16**	**年09月10日2018**	**年09月25日2018**	
148	竣工资料整理	个工作日10	年09月10日2018	年09月19日2018	
149	业主验收	个工作日3	年09月19日2018	年09月21日2018	
150	工程移交	个工作日3	年09月23日2018	年09月25日2018	

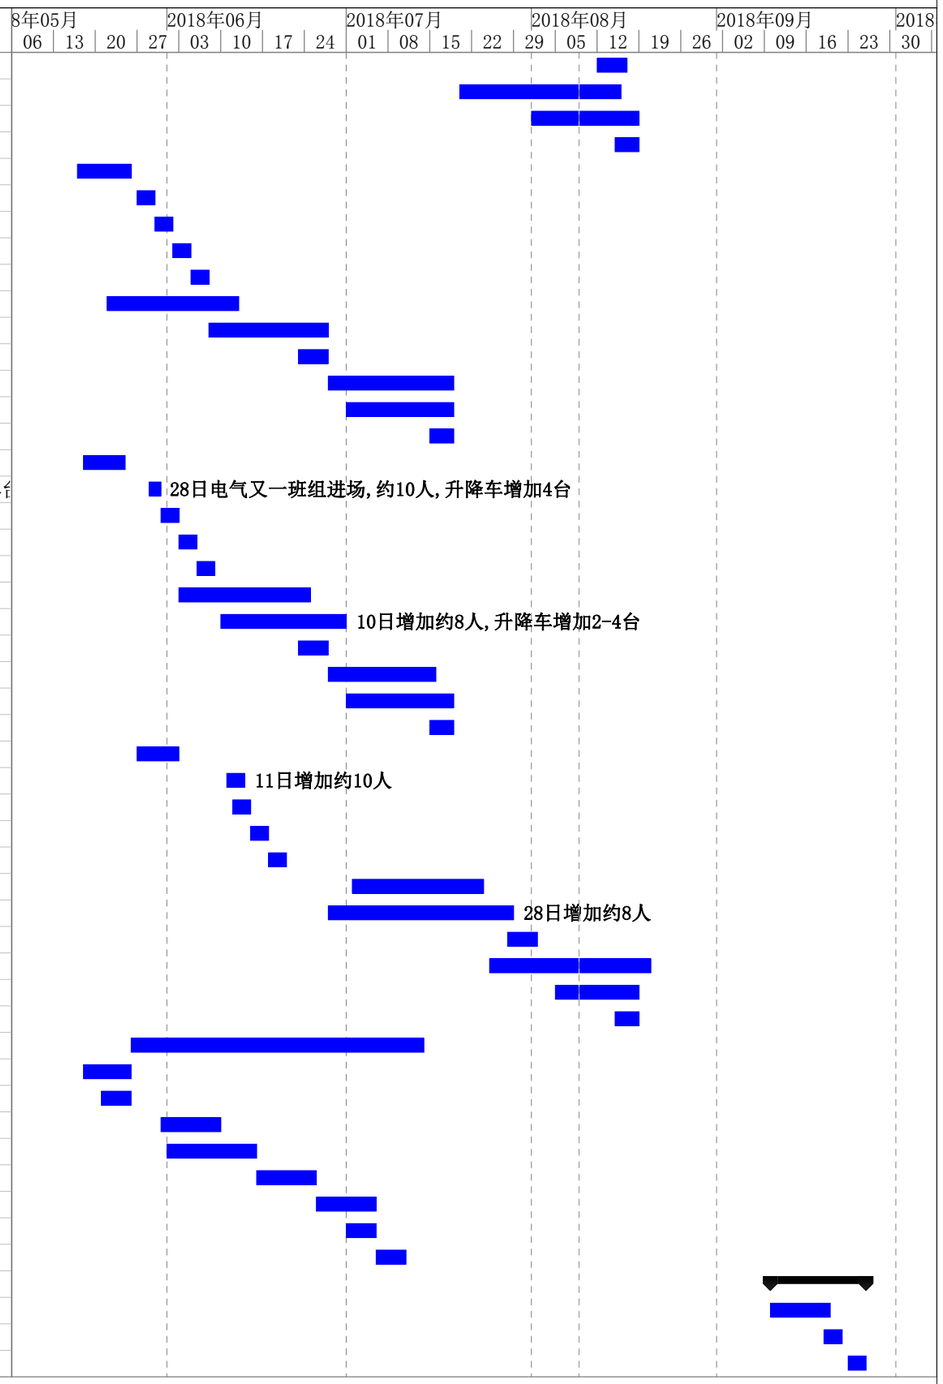

项目：乐歌工程进度计划
日期：2018年08月09日

任务 | 项目摘要 | 非活动摘要 | 手动摘要 | 外部里程碑
拆分 | 外部任务 | 手动任务 | 仅开始时间 | 进度
里程碑 | 外部里程碑 | 仅工期 | 仅完成时间 | 期限
摘要 | 非活动里程碑 | 手动摘要总成 | 外部任务
